

TSR - Aufmaßskizze

Studio:

BST
Auftrags-Nr.:


Komm.:

Lieferadresse:


Wunschtermin: UK KW X
Geländer KW X
Stufen 6 Wo. n. Abruf

vom Aufmaßnehmer
auszufüllen

vom Aufmaßnehmer
auszufüllen

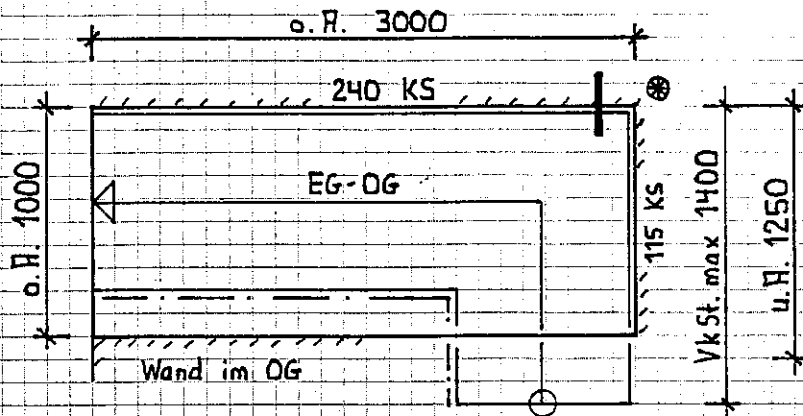

⊗ Wände liegen hier übereinander

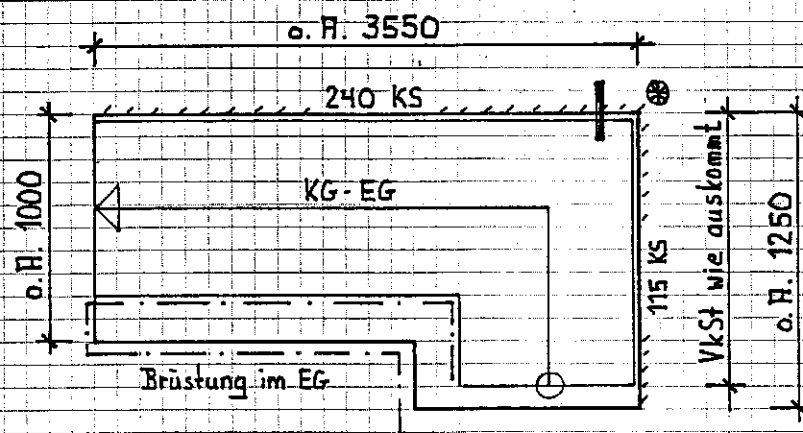

— — — — — Geländer

OKF DG	
OKF OG	
80	
180	Holz
40	
80	
2800	15 Stg.
OKF EG	
100	
180	Beton
2625	14 Stg.
OKF KG	
50	

Deckenverkleidung

Alle angegebenen Maße sind Fertigmaße in mm

kompl. Aufbauhöhe über Rohdecke	KG-EG		EG-OG		OG-DG
		50	100	100	80
Stufenbreite	max. möglich		max möglich		
Stufenmaterial	Holz		Holz		
Stufenstärke	40		40		
Antritt	Un 1		wie erforderl.		
VKST	wie auskommt		max. 1400		
Austritt	Ob 3		Ob 3		
Wandaufbaustärke (Putz)	15		15		
Wände	Kalksandstein		Kalksandstein		

Altbau	<input type="checkbox"/>	Neubau	<input checked="" type="checkbox"/>	Beton	siehe oben	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Geschäftshaus	<input type="checkbox"/>	Wohnhaus	<input checked="" type="checkbox"/>	Baurechtsleisten		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/>	Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Wohnungen	1	
Notwendige Treppen	<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht notwendige Treppen	<input type="checkbox"/>	Bauabnahme		<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

OG-DG
EG-OG
KG-EG
